

I-7-1

사성교(舊 안양교) 확장

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
I-7-1	계속	임기내완료	시비	도로과	서울시 도시기반시설본부(토목부)

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
확인지표 \ 연도	기투자	2018년	2019년	2020년	2021
○ 공사시행	공사시행	공사시행	공사시행	공사준공	
달성도	30%	50%	80%	100%	

정책목표

- 남부순환로 광복교~안양교 병목구간의 도로확장 및 노후교량(안양교) 성능을 개선함으로써 도로기능의 안전성 유지와 원활한 교통운영 확보

사업개요

- 위 치 : 구로구 개봉동 ~ 구로동 구로IC앞
- 규 모 : 도로확장 폭4~5차로 → 6차로, 연장 1.1km
- 사업기간 : 2006. ~ 2020.12
- 추진방법 : 연차별로 예산확보하여 사업시행
- 총사업비 : 83,284백만원

이행계획


- 그간 추진사항(계속사업의 경우)
 - 2006.06.~2007.11. : 안양교 기본설계 시행
 - 2007.12.~2009.02. : 안양교 실시설계 시행
 - 2012.05.~2015.02. : 실시설계 보완용역 시행
 - 2016.04.01 : 공사착공
 - 2017.03.10 : 안양교 우회 가교 개통
- 세부추진계획
 - 2018.10.~ : 안양교 신설교량(구로IC방향) 상부공 시공중
 - 2019.01.~2020.12 : 공사 계속시행

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분		연도별 투자계획				
(1)추진내용	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년
○공사시행	83,284	18,700	9,560	18,220	36,804	
총계	83,284	18,700	9,560	18,220	36,804	
(2) 예산구분	국비					
	시비	83,284	18,700	9,560	18,220	36,804
	구비					
	기타(민자)					

□ 위치도

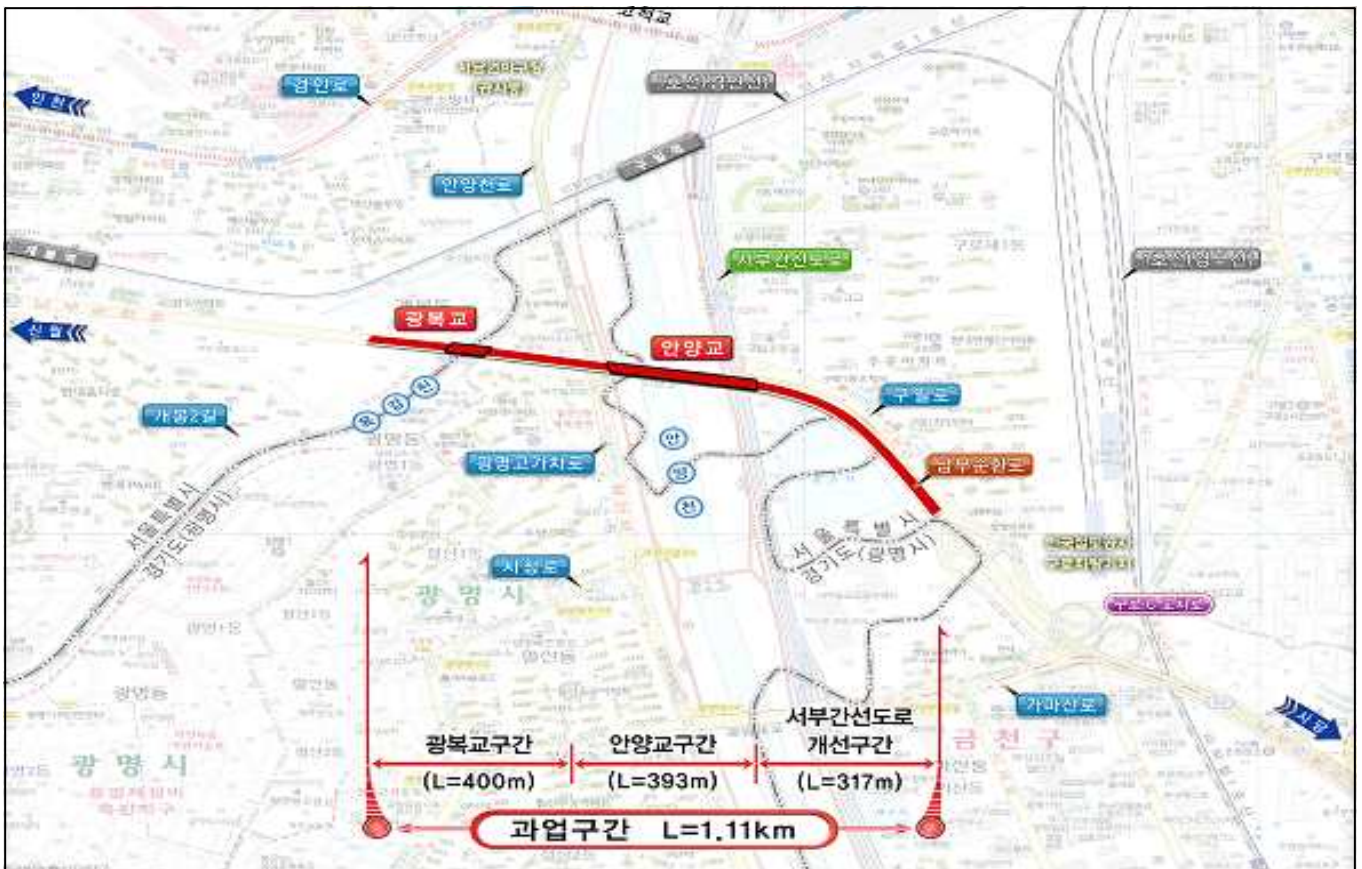

담당자	부서:도로과	주무관 : 지종삼	전화번호 : 860-2257
-----	--------	-----------	-----------------
