

I-1-2 서부간선도로 지하화 및 상부 친환경 공원 조성

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
I-1-2	계속	임기내착수	시비/민자	도로과	서울시 도시기반시설본부(토목부)

연도별 공약이행로드맵(확인지표)						
확인지표	연도	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년
○ 서부간선도로 지하화 (공사시행)		공사시행	공사시행	공사시행	공사시행	공사준공
○ 서부간선도로 상부 친환경 공원 조성 (실시설계용역 착수)		기본설계용역 시행	기본설계용역 준공	실시설계용역 착수	실시설계용역 준공 및 공사시행	공사시행
달성도		10%	20%	40%	65%	100%

정책목표

- 서부간선도로 상시정체 해소를 위하여 서부간선도로를 지하화하고 기존도로는 일반도로화하여 친환경 조성 및 안양천 접근성 제고

사업개요

- 서부간선도로 지하화
 - 위치 : 영등포구 양평동(성산대교 남단) ~ 금천구 독산동(금천IC)
 - 규모 : 왕복4차로, 연장 10.33km
 - 사업기간 : 2010. ~ 2021.
 - 추진방법 : 연차별로 예산 확보하여 사업시행
 - 총사업비 : 520,000백만원(민간382,000 시비138,000) ※ 2007년 당초 불변가
- 서부간선도로 상부 친환경 공원 조성
 - 위치 : 영등포구 양평동 목동교 ~ 금천구 독산동 금천교
 - 규모 : 왕복4차로, 연장8.1km, 친환경공간131,000㎡(구로구 구간 3.6km)
 - 사업기간 : 2013. ~ 2023.
 - 추진방법 : 연차별로 예산 확보하여 사업시행
 - 총사업비 : 86,669백만원

□ 이행계획

○ 그간 추진사항(계속사업의 경우)

- 서부간선도로 지하화
 - 2010.06.14 : 우선협상대상자 선정
 - 2014.02.27 : 도시계획시설(도로) 결정고시
 - 2015.12.03 : 실시계획 승인
 - 2016.03.01 : 공사착공
 - 2018.04.11 : 4대 주민현안 관련 구청장 면담
- 서부간선도로 상부 친환경 공원 조성
 - 2018.05. ~ 2018.07. : 기본설계용역 시행
 - 2019. ~ 2020. : 실시설계용역 시행

○ 세부추진계획

- 서부간선도로 지하화
 - 2018.10. ~ : 본선굴착중(성산6,572m중1,651m, 일직6,589m중1,029m)
 - 2019.01. ~ 2021.02. : 공사 계속시행
- 서부간선도로 상부 친환경 공원 조성
 - 2016.05.19 ~ 2018.12. : 기본설계용역 시행 및 도시재생 관련 사업 검토중
 - 2019. ~ 2020. : 실시설계용역 시행

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획				
(1)추진내용	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년
○ 서부간선도로 지하화 (공사시행)	744,988	225,252	189,847	148,450	148,450	32,989
○ 서부간선도로 상부 친환경 공원 조성 (실시설계용역 착수)	86,669	1,307		34,145	25,609	25,608
총 계	831,657	226,559	189,847	182,595	174,059	58,597
[2] 예산구분	국비					
	시비	274,473	43,307	39,350	82,049	73,513
	구비					
	기타(민자)	557,184	183,252	150,497	100,546	100,546

□ 기타사항 (현안사항)

○ 서부간선도로 지하화

- 터널내 화재시 배연구는 필요하나 정화시설을 겸비한 배연구 설치
- 이동식집진기 설치 현황
 - 구로1동(2대) 2018.2.1 설치, 신도림동(1대) 2018.02.26 설치

○ 서부간선도로 상부 친환경 공원 조성

- 기본설계용역 시행중(도로계획과), 도시재생 관련 사업계획 검토중(도시재생본부)

□ 주민배심원단 권고안 (2018.8.9. ~ 8.30)


○ 권고안 주요내용

- 전문가와 주민이 감시할 수 있는 기구 구축필요
- 구로 디지털단지 근처 교통을 잘 파악한 후 상부 공사 진행
- 친환경 공원 조성의 구체적 계획 제시

○ 주관부서 검토의견

- 서울시 도시기반시설본부에서 시행하고 있는 사업으로 현재 주민참여 TF구성 운영 중에 있고, 지상부 공원 조성계획은 용역 검토중에 있음.
- 우리구 관내 서부간선도로 상부 공간 활용 방안에 대해 계획수립 단계부터 서울시와 협의하여 주민 의견이 반영될 수 있도록 추진하겠음.

□ 위치도

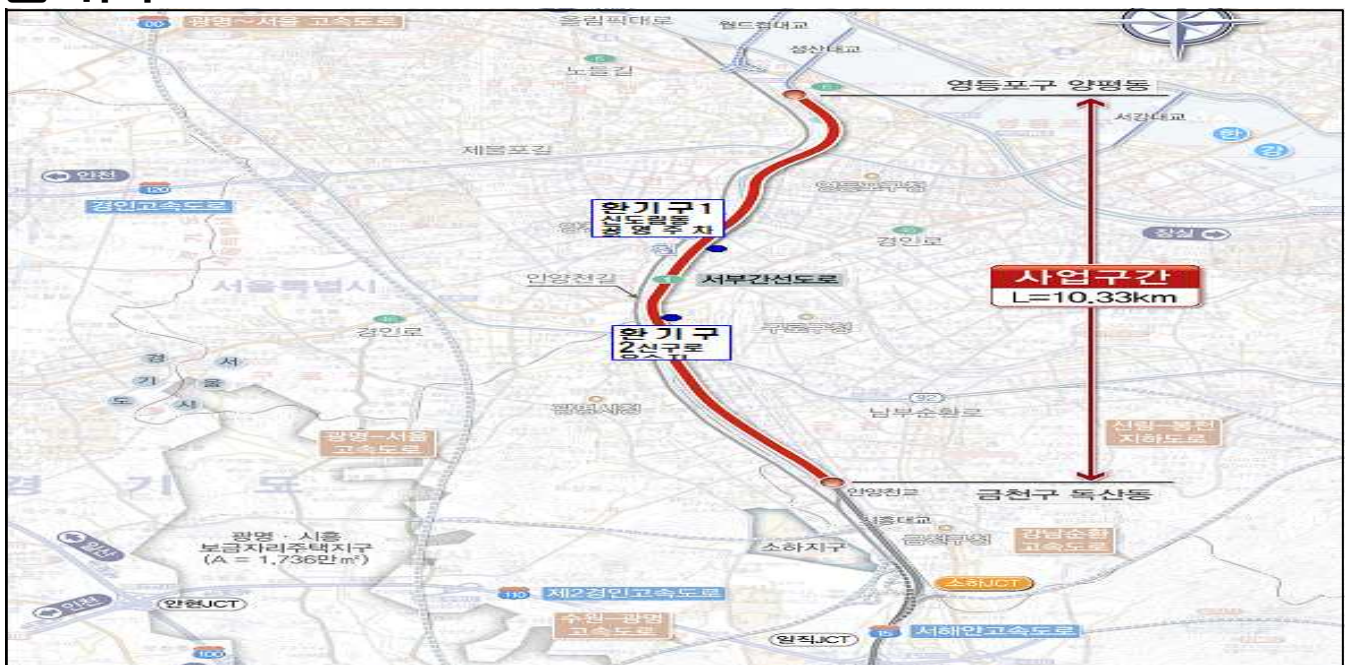

담당자

부 서:도로과

주무관 : 지종삼

전화번호 : 860-2257
