

IV-1-3

천왕산 야적부지 캠핑장 조성

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
IV-1-3	신규	임기내완료	시비	공원녹지과	공원조성과(서울시)

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
확인지표 \ 연도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 캠핑장 조성	야적부지 폐기물처리, 진입로 정비	도공위심의, 실시설계 및 공사착공	공사준공		
달성도	10%	50%	100%		

정책목표

- 관내 캠핑장 조성으로 지역주민 휴양, 여가 공간 제공
- 야적부지 등 산림훼손지역 복구 및 공원시설 확충

사업개요

- 위 치 : 향동 149-1 일대(천왕도시자연공원)
- 기 간 : 2015. 1. ~ 2020. 12.
- 규 모 : 26,500㎡
- 사업내용
 - 야외캠핑장 조성, 휴게쉼터, 다목적구장, 관리사무소 등
- 총사업비 : 7,933백만원(시비)
 - 보상비 5,613, 조성비 2,320


이행계획

- 그간 추진사항
 - 2014. 4. 24 : 공원조성계획결정 (서울특별시고시 제2014-155호)
 - 2014. 8. : 서울시 투자심사(적정)
 - 2015. 4. 9 : 사업시행인가 (구로구고시 제2015-54호)
 - 2015. ~ 2017. : 토지 및 지장물 보상(5,776㎡)
 - 2018. 1. ~ 6. : 철거공사 및 폐기물처리용역 시행 등

○ 세부추진계획

- 2018. 7. ~ 12. : 공원진입로 정비공사, 소규모 환경영향평가 시행
- 2019. 1. ~ 12. : 조성비 예산확보, 실시설계, 도시공원위원회 심의, 캠핑장 조성공사 착공
- 2020. 1. ~ 12. : 캠핑장 조성공사 시행 및 준공

○ 공원조성계획도(안)

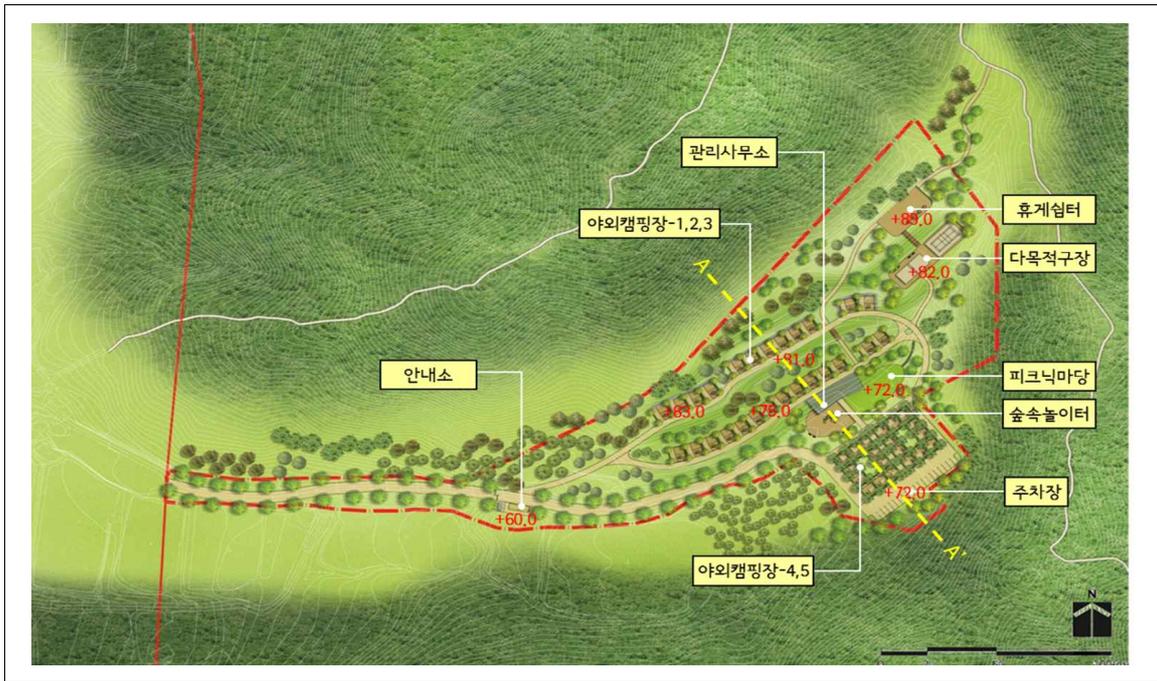

○ 조감도



연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획					
(1)추진내용	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 캠핑장 조성	7,933	4,849	764	2,320			
총 계	7,933	4,849	764	2,320			
[2] 예산구분	국비						
	시비	7,933	4,849	764	2,320		
	구비						
	기타(민자)						

담당자	부 서 : 공원녹지과	주무관 : 김현재	전화번호 : 860-2321
-----	-------------	-----------	-----------------
